

# MØTEREFERAT

## Styringsgruppemøte fotballbane FOMA

Tid 11.07.2024 kl.10.00 – 10.50

Sted Teams

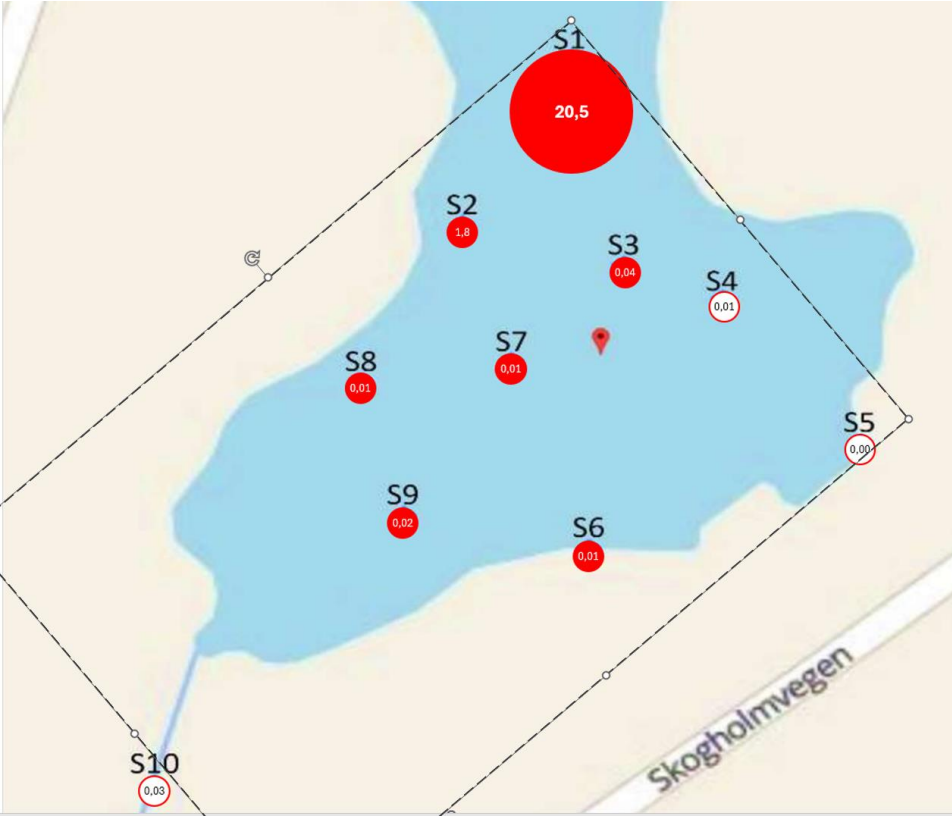
Referent Harald Karlstrøm

Neste møte: Ikke berammet

### Deltakere:

Firma	Navn	Initialer	Tilstede	Referat
Båtsfjord kommune	Espen Nystad	EN	x	x
Båtsfjord Havn	Morten Albertsen	MA	x	x
DJAS	Jan Steinar Romsdal	JSR	x	x
WSP	Harald Karlstrøm	HK	x	x

Sak	Tekst	Frist	An-svar-lig
00	JSR hadde gjennom Interaxo rapportert resultatene fra de siste setningsmålingene foretatt 10.07.		
01	<p><b>FOMA-områdets stabilitet og beslutning om utlegg av kunstgress i høst</b></p> <p>Bakgrunnen for styringsgruppens behandling av denne saken på dette tidspunktet er at DJAS har en tidsfrist 15.07 for å melde til sin leverandør av kunstgress om gresset skal legges i september eller om utleggingen skal utsettes til våren. Kunstgress er til en viss grad «ferskvare» som ikke bør ligge på lager over en vinter men produseres så tett opp til utlegging som mulig.</p> <p>Styringsgruppen må dermed vurdere og beslutte om baneområdet er stabilt og klart for utlegging i september eller om utleggingen bør utsettes til våren.</p> <p>En utsettelse reduserer sannsynligheten for setningsskader etter at gresset er lagt. Bruken av banen blir neppe særlig omfattende i høst før vinteren setter inn.</p> <p>Likevel er det en fordel at banen er klar til vårsesongen så snart snøen blir borte.</p> <p>En utsettelse vil ventelig medføre økte kostnader. Gressleveransen vil kunne stige gjennom inflasjonsjustering med rundt kr 250.000. Og det vil være nødvendig med en ekstra runde på avrettingslaget før gresset legges noe som kan beløpe seg til rundt kr. 100.000. Vårt prosjektbudsjett vil ikke inflasjonsjusteres og det vil dermed bli trangere rammer for øvrige tiltak i prosjektet.</p> <p>Stabilitetsmålingene viser at det meste av arealet nå er stabilt innenfor målemetodens feilmargin.</p> <p>Det eneste området som fortsatt har setninger av betydning, er det nordlige hjørnet av banen på målepunkt S1. Her har innsynkningen vært på 20,5 cm siden 18.</p>		

Sak	Tekst	Frist	An- svar- lig
	<p>juni. Dette er signifikant og godt utenfor feilmarginer. Denne delen av baneområdet er ennå ikke stabilt.</p>  <p>Måleresultatet på målepunkt S10 som ihht forrige måling hadde sunket 4 cm på en uke, viste at punktet hadde steget tilbake til sitt tidligere stabile nivå. Det mistenkes at forrige måling ikke viste et reelt resultat og at denne delen av området også egentlig er stabilt.</p> <p>Det skal foretas en ekstra måling av punktene S1 og S10 for å verifisere resultatet fra 10.07 så snart som mulig.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styringsgruppen konstaterer at det meste av fyllingen nå er stabil.</p> <p>Det nordlige hjørnet ved cornerflagget (S1) er fortsatt synkende og har sunket med 20 cm bare de siste to ukene siden forrige måling.</p> <p>Styringsgruppen ser ikke at området allerede nå kan meldes klart for utlegging av gress og ber JSR om å ha dialog med gressleverandør Unisport om fristen kan utsettes og i tilfelle hvor lenge.</p> <p>Nye setningsmålinger skal gjennomføres i uke 30. Basert på disse målingene og tilbakemeldingen fra Unisport, vil styringsgruppen ta stilling til spørsmålet om utleggingen av kunstgresset skal en utsettes til våren.</p> <p>Alle andre tiltak i prosjektet skal uansett gjennomføres høsten 2024.</p>		
02	<p><b>Gjerde og ballnett</b></p> <p>På forrige styringsgruppemøte ble det vedtatt å erstatte gjerde langs Skogholmveien med ballnett. Ballnett her er viktig av trafikksikkerhetsgrunner da det er lite ønskelig at barn løper ut på trafikkert vei for å hente ballen.</p>		

Sak	Tekst	Frist	An- svar- lig
	<p>I ettertid har det kommet frem betenkeligheter ved å bare ha ballnett uten gjerde. Et ballnett har ikke samme adkomstregulerende effekt, spesielt på vinteren da ballnettene bør tas ned for ikke å rives i filler av vinterstormene.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styringsgruppen ser at det er nødvendig å beholde inngjerdingen av hele baneområdet som en del av barrieren rundt banen som tidligere planlagt.</p> <p>Ballnett prioriteres i første omgang mot målet i sør og mot Skogholmveien.</p> <p>Styringsgruppen ber DJAS om et kostnadsestimat for oppsett av ballnettfundamenter rundt hele banen. Med fundamenter på plass, kan kommunen eventuelt supplere med flere ballnett på et senere tidspunkt.</p>		
